

Status Persiapan Dokumen Akreditasi Institusi

STEI Fitrah Insani — BAN-PT IAPT 4.0 & LAMEMBA

Update per: 15 Juni 2026 Target Submisi SAPTO: April 2027 Total Langkah: 10

0

LANGKAH SELESAI

6

SEBAGIAN

4

BELUM DIKERJAKAN

Ringkasan Eksekutif: Tidak ada langkah yang berstatus SELESAI sepenuhnya per 15 Juni 2026. Mayoritas langkah berada pada status SEBAGIAN — kerangka dokumen (template LED, SOP, RENSTRA/RENOP, Statuta) sudah tersedia, tetapi pengisian data kuantitatif faktual dan finalisasi narasi masih menjadi pekerjaan utama Tim Satgas.

SELESAI — tugas telah dikerjakan & tersedia

SEBAGIAN — kerangka ada, data/narasi belum lengkap

BELUM — belum ditemukan bukti pengerjaan

STATUS 10 LANGKAH PANDUAN AKREDITASI

1 Data Dasar Institusi

SEBAGIAN

Waktu: 1–3 hari

PIC: Admin/TU

8 sel kosong identitas LED (NUPTK, e-mail/website, No. SK LAMEMBA) tinggal diisi dari data yang sudah tersedia.

2 Data SDM & Mahasiswa

SEBAGIAN

Waktu: 3–5 hari

PIC: Kaprodi + TU

Nama dosen & mahasiswa tersedia; tabel DTSP format LKPT dan rasio dosen:mahasiswa belum dibuat.

3 Keuangan & Sarpras

BELUM

Waktu: 3–5 hari

PIC: Wakil Ketua II

Progres paling rendah. Laporan keuangan teraudit & data sarpras butuh lead time administratif panjang — mulai paralel sekarang.

4 Kondisi Eksternal & SWOT

SEBAGIAN

Waktu: 3–5 hari

PIC: Ganjar + Izzuddin

Matriks SWOT lengkap di RENOP; kerangka PESTEL/Five Forces dari Modul Manajemen Strategis siap diadaptasi ke narasi LED.

5 Tata Pamong & Tata Kelola

SEBAGIAN

Waktu: 3–5 hari

PIC: Agung Mulyana

5 fungsi manajemen (Kriteria 3.8a) sudah SELESAI; GUG, PMBM, & kebijakan anti-korupsi/kekerasan seksual masih perlu dilengkapi.

6 Roadmap Penelitian/PKM

SEBAGIAN

Waktu: 5–7 hari

PIC: LPPM / Dosen

1 HKI buku terdaftar (Des 2025) siap jadi eviden Kriteria 2.2; roadmap mandiri & rekap publikasi SINTA belum dibuat.

7 Tracer Study

SEBAGIAN

Waktu: 7–14 hari

PIC: Kaprodi + Admin

SOP-WK3-ALM-02 baku (distribusi Feb–Mar, lapor Jun, target ≥60%); perlu konfirmasi siklus tahun berjalan sudah mulai.

8 Daftar & Lampiran

BELUM

Waktu: 5–7 hari

PIC: Sekretaris Satgas

Belum ada daftar lampiran bernomor (L-01 dst.) maupun struktur folder per kriteria IAPT 4.0.

9 Finalisasi & Review LED

BELUM

Waktu: 5–7 hari

PIC: Seluruh Tim

Inkonsistensi "Fitrah" vs "Fithrah Insani" masih ditemukan termasuk pada Statuta Revisi 2026 — perlu penyeragaman.

10 Submit ke SAPTO BAN-PT


BELUM

Waktu: 1–3 hari

PIC: Ketua STEI FI

Bergantung penuh pada penyelesaian Langkah 1–9. Target April 2027, 3 bulan sebelum akreditasi LAMEMBA berakhir.

ROADMAP TIMELINE — JUNI 2026 S/D APRIL 2027

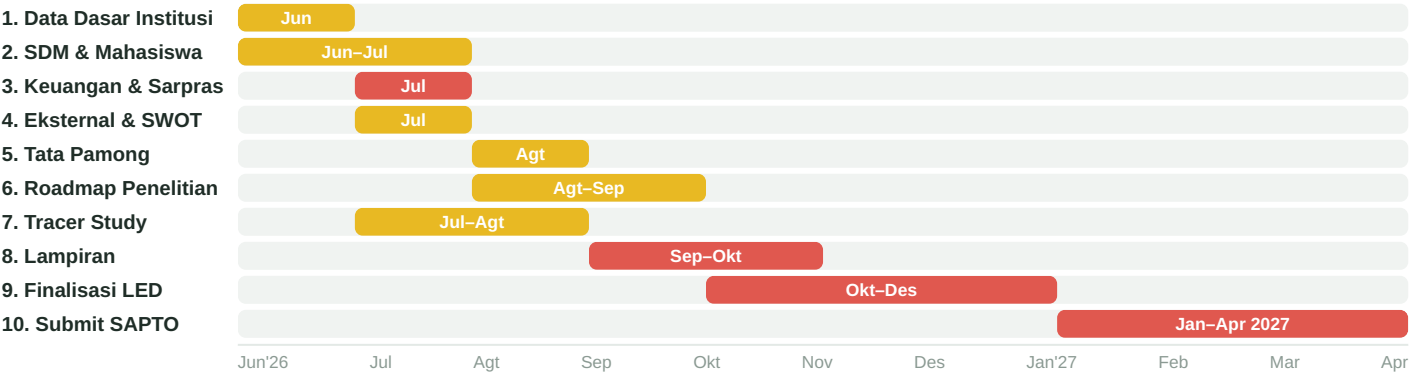

PRIORITAS TINDAK LANJUT

TINGGI — 1-2 SESI KERJA

- Isi 8 sel kosong identitas LED & Tim Penyusun (SK Kemenag 1137/2023, berdiri 12 Des 2023, telp 022-6625677, 9 nama tim).
- Pindahkan Matriks SWOT lengkap dari RENOP ke tabel Kriteria 4-38 LED.
- Salin tabel 5 fungsi manajemen (Kriteria 3.8a, sudah SELESAI) sebagai acuan format kriteria lain.
- Cantumkan HKI buku "Lembaga Keuangan Syariah" (No. 001061957) di tabel HKI Kriteria 2.2.

SEDANG — 1-2 MINGGU

- Susun tabel DTPS format LKPT (NIDN, jabfung, pendidikan, mata kuliah).
- Adaptasi kerangka PESTEL Modul Manajemen Strategis menjadi narasi Kondisi Eksternal LED.
- Rekap publikasi dosen 3 tahun terakhir ke format tabel LED.
- Konfirmasi status siklus Tracer Study SOP-WK3-ALM-02 tahun berjalan.

KRITIS — RISIKO TINGGI, MULAI SEKARANG

- Langkah 3 (Keuangan & Sarpras): mulai paralel — penunjukan KAP & survei sarpras butuh lead time panjang.
- Seragamkan penamaan institusi "Fitrah Insani" (acuan SK Kemenag 1137/2023) vs "Fithrah Insani" di seluruh dokumen termasuk Statuta.
- Langkah 8 (Lampiran): mulai susun struktur folder & penomoran L-01 sejak dini, paralel dengan langkah lain.

Disclaimer Metodologis: Status di atas didasarkan pada penelaahan dokumen kerja dalam basis pengetahuan proyek per 15 Juni 2026, dan tidak mencakup pekerjaan yang mungkin telah dilakukan secara lisan, dalam rapat yang belum dinotulensikan, atau dalam sistem eksternal (PDDIKTI, SAPTO, Google Drive/Sheets) yang tidak dapat diakses langsung. Gunakan dokumen ini sebagai bahan rapat verifikasi status dengan seluruh PIC Langkah 1–10 sebelum dijadikan acuan kerja resmi.
